

Dopravní terminál Zlín – Centrum (DTZ)

Situační zpráva 10.09.2018



Aktuální stav a historie přípravy DTZ


- 2015 – Memorandum o spolupráci (SMZ, Z-Group, Zlínský kraj, Cream)
- 2016 – Smlouvy o spolupráci a společném postupu zadavatelů mezi SMZ a Z-Group
- 2016 – Zbourání objektu podél nadjezdu tzv. „parníku“
- 2017 – Smlouvy o spolupráci a společném postupu zadavatelů mezi SŽDC a Z- Group
- 2017 – Zadávací řízení na zhotovitele PD Terminál Zlín Centrum (vybraný zhotovitel Centroprojekt)
- 2017 - 07/2018 zpracování dokumentace Terminál Zlín Centrum
- Probíhá inženýrská činnost vedoucí k vydání územního rozhodnutí (předpoklad do konce roku 2018)
- Připraven materiál do ZMZ pro schválení dalších projekčních prací na dokumentaci pro stavební povolení DTZ centrum, tak aby bylo možné stavět v roce 2020 (předpoklad i u železnice, nutná věcná a časová koordinace)
- V roce 2019 je nutné dořešit majetkové záležitosti , zahájit práce na smlouvách pro směny, odkupy nájmy případně kombinace (zejména vztah Z-Group/SMZ/SŽDC)

1177/7

1164/19

1164/1


Terminál Zlín Centrum - moderní přestupní uzel

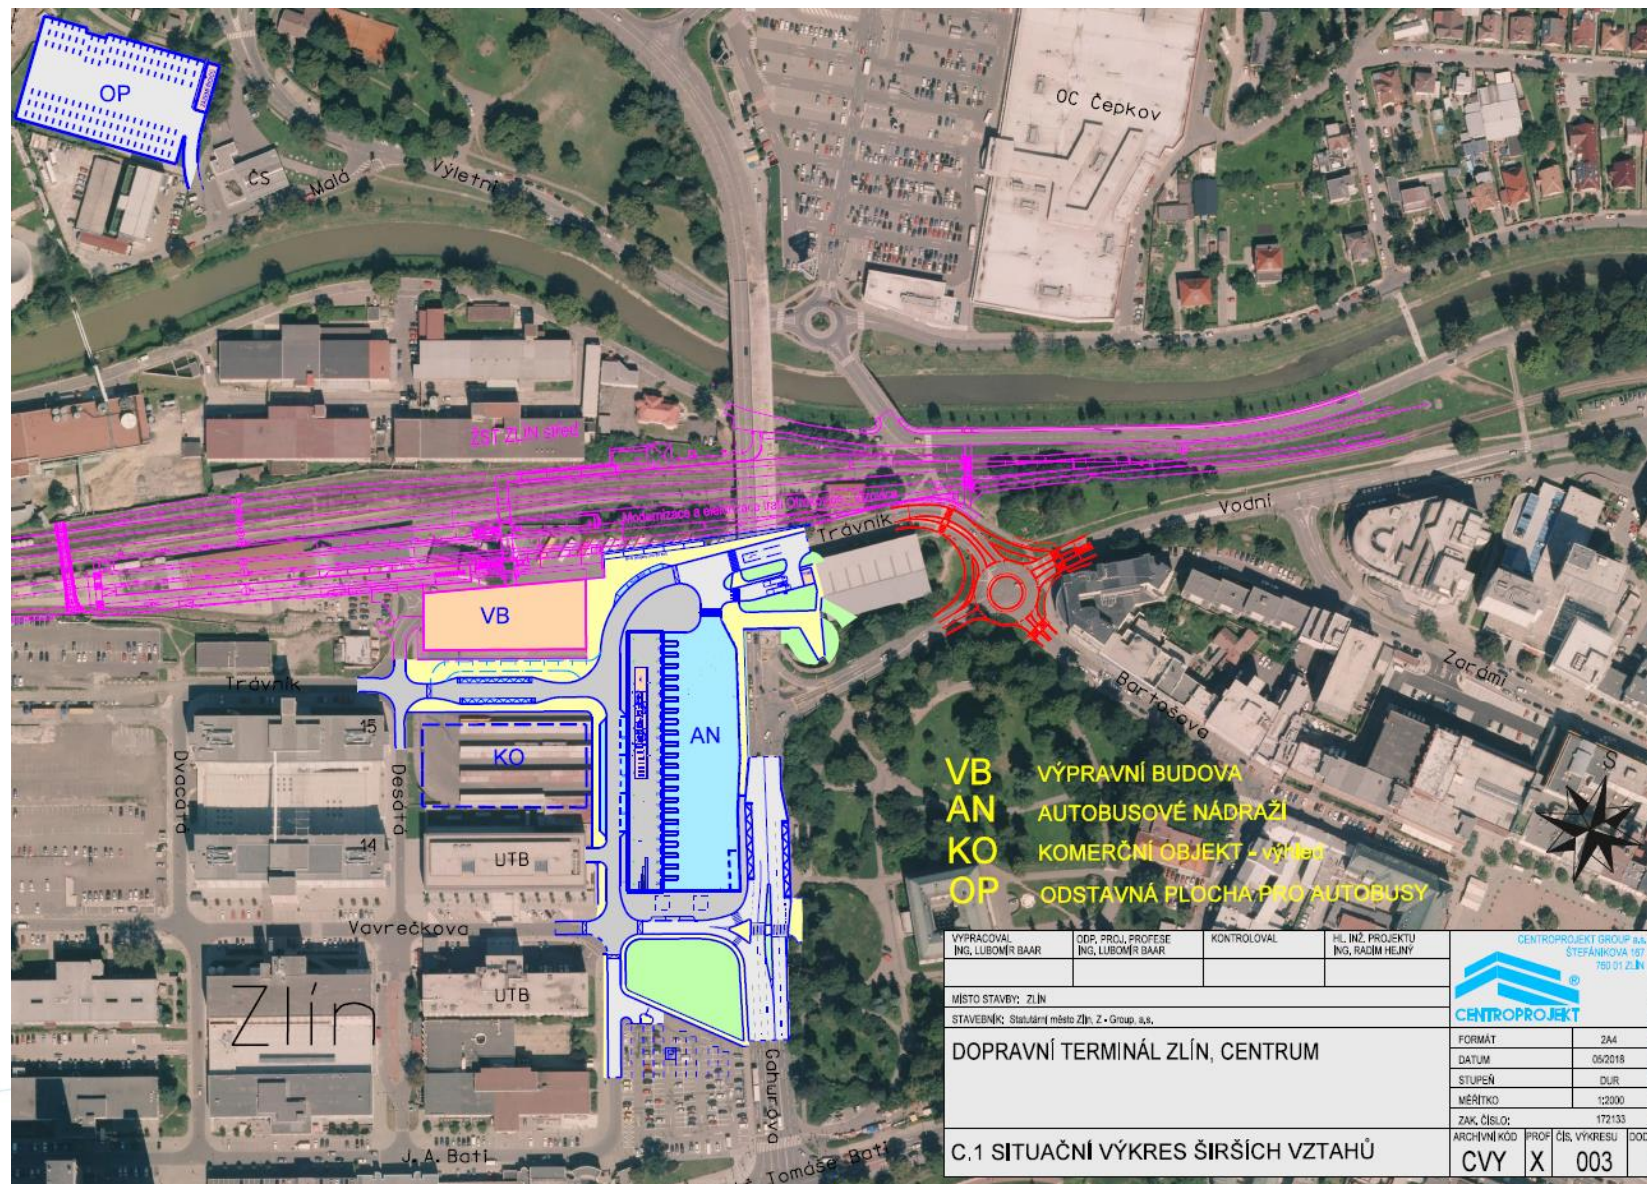

Řešení DTZ bude realizováno ve dvou etapách



V 1. etapě dojde k **výstavbě výpravní budovy železničního terminálu** a k mírné úpravě fungování autobusového nádraží – úprava pro odstavení a parkování autobusů

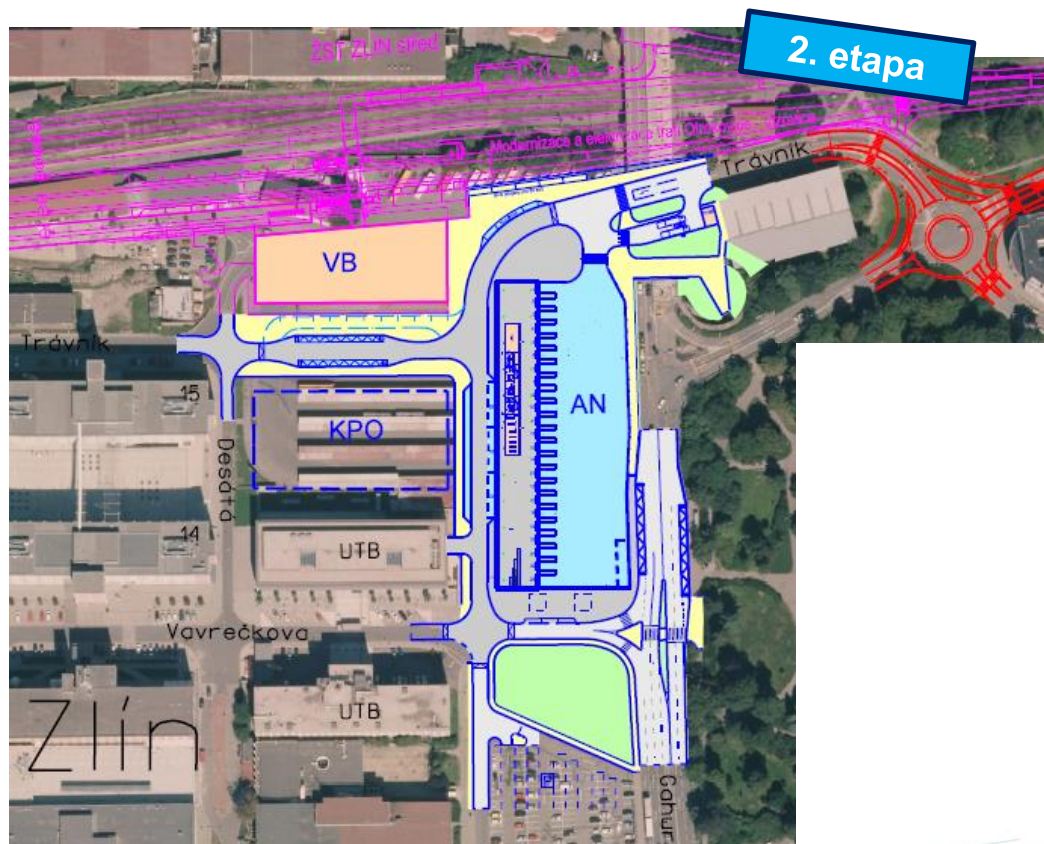

V 2. etapě dojde k **výstavbě budovy autobusového nádraží vč. odstavné plochy pro parkování autobusů** a k reorganizaci dopravy v nejbližším okolí autobusového nádraží

Rámcový harmonogram prací DTZ

Výpravní budova

- Územní řízení do 12/2018
- Příprava DSP, inženýrská činnost, vydání SP do 12/2019
- Tendrová dokumentace, výběr zhotovitele do 06/2020
- Výstavba do 06/2022

Autobusové nádraží, přilehlé komunikace a odstavné stání


- Příprava DÚR, inženýrská činnost, vydání ÚR do 12/2018
- Příprava DSP, inženýrská činnost, vydání SP do 10/2019
- Tendrová dokumentace, výběr zhotovitele do 04/2020
- Výstavba do 07/2022

Harmonogram je v souladu harmonogramem Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice

Současný stav



Současný stav

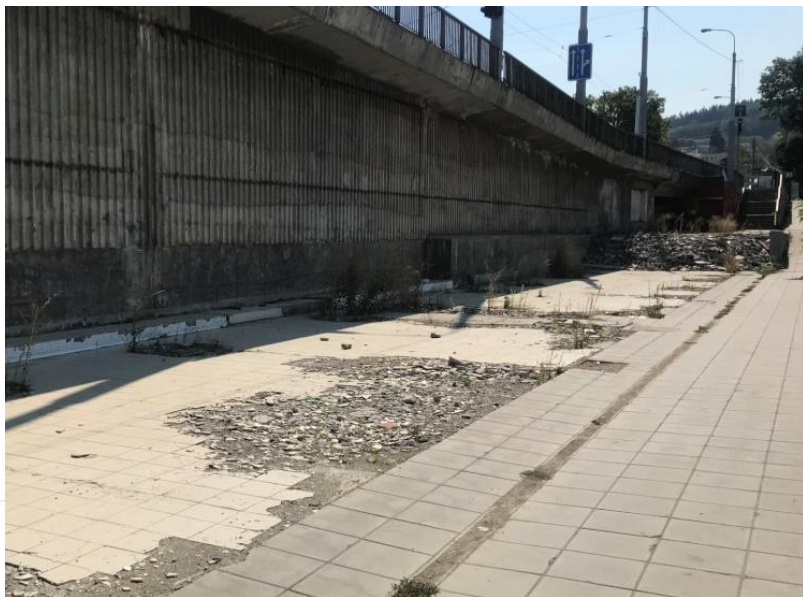

1164/1

Vizualizace objektu autobusového nádraží



1164/19

1164/1

Vizualizace objektu autobusového nádraží



1164/19

1164/1


Vizualizace objektu autobusového nádraží



1164/19

1164/1

Vizualizace objektu autobusového nádraží

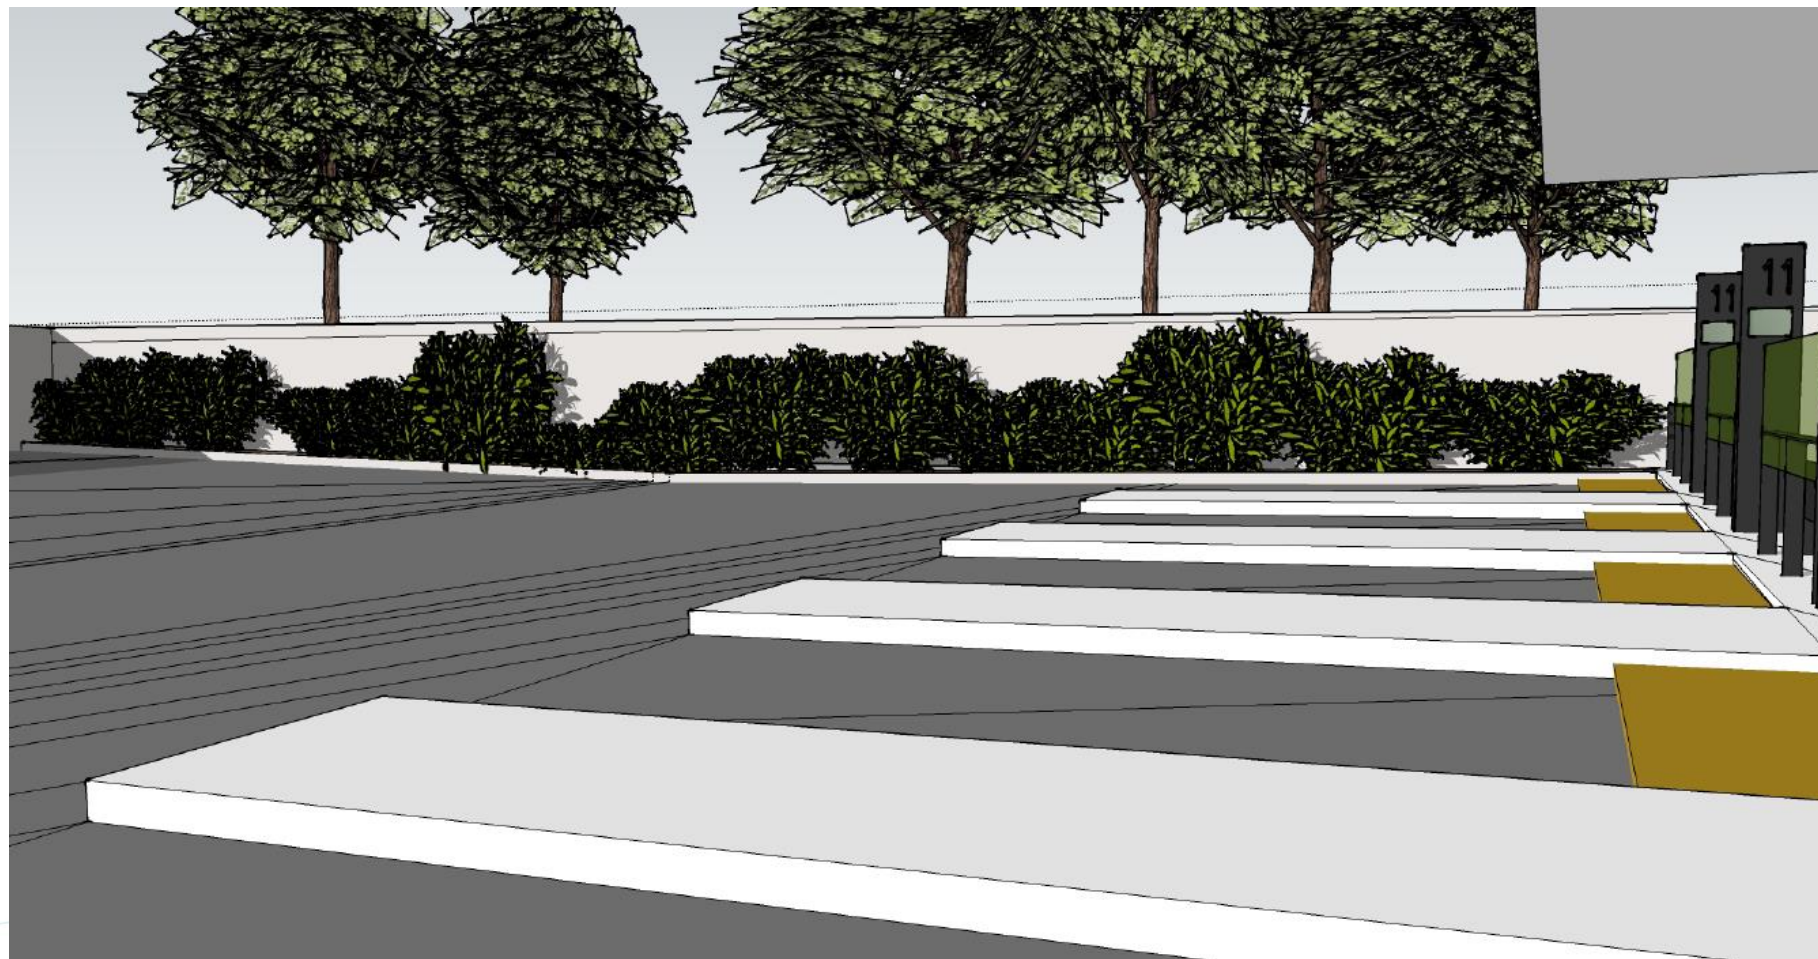

1164/19

1164/1

Vizualizace objektu autobusového nádraží



1164/19

1164/1

Vizualizace objektu autobusového nádraží



1164/19

1164/1


Vizualizace objektu autobusového nádraží



1164/19


1164/1

Výpravní budova – Řez A-A (v ose podchodu)

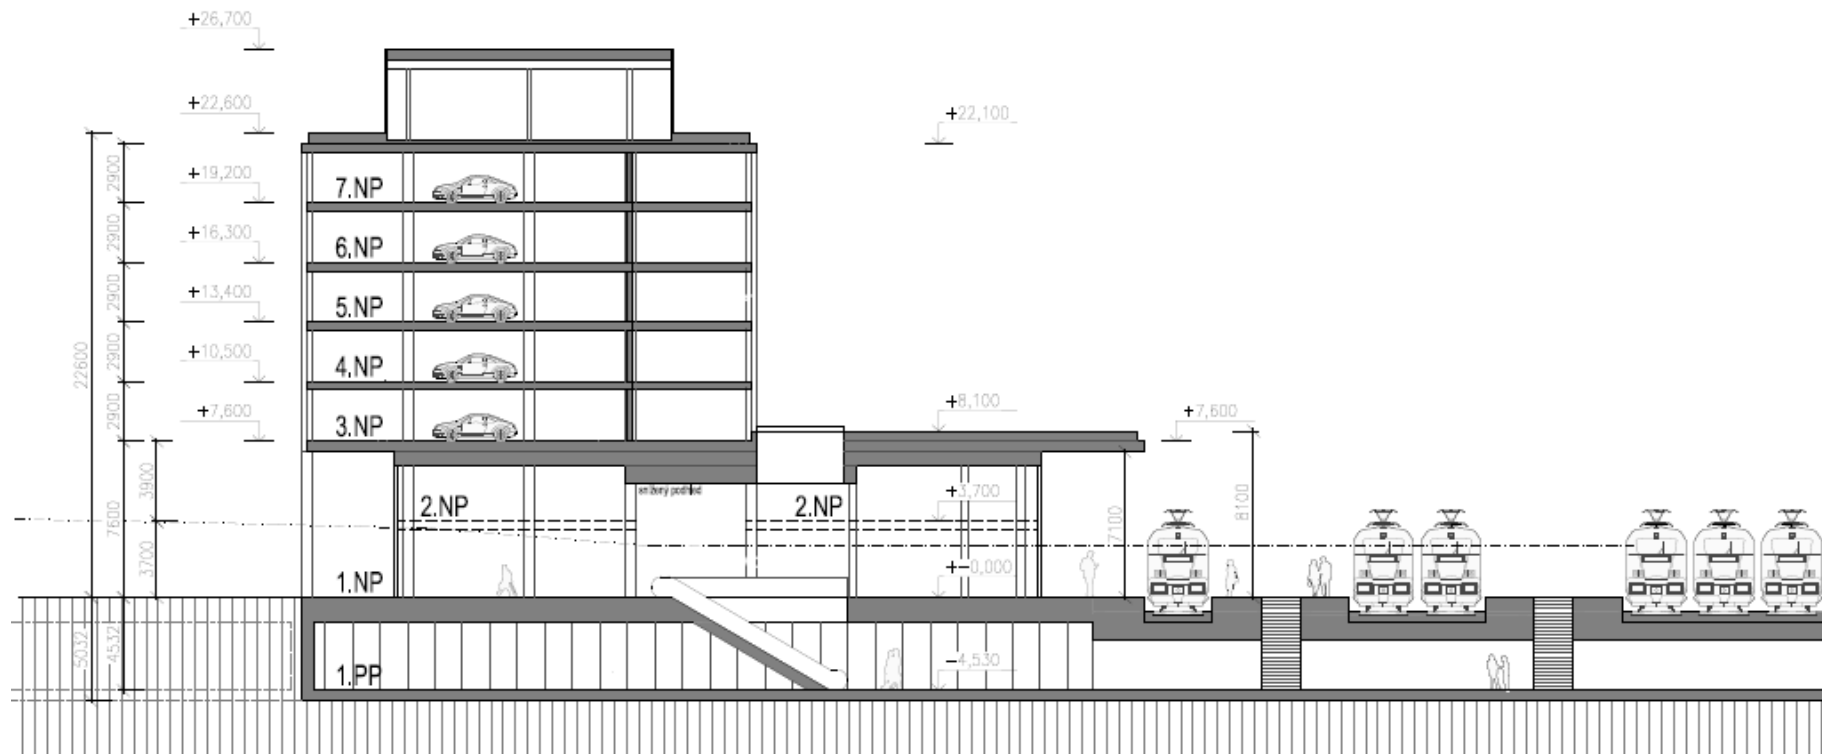

Výpravní budova – Pohledy

POHLED OD JIHU (od autobusového nádraží)

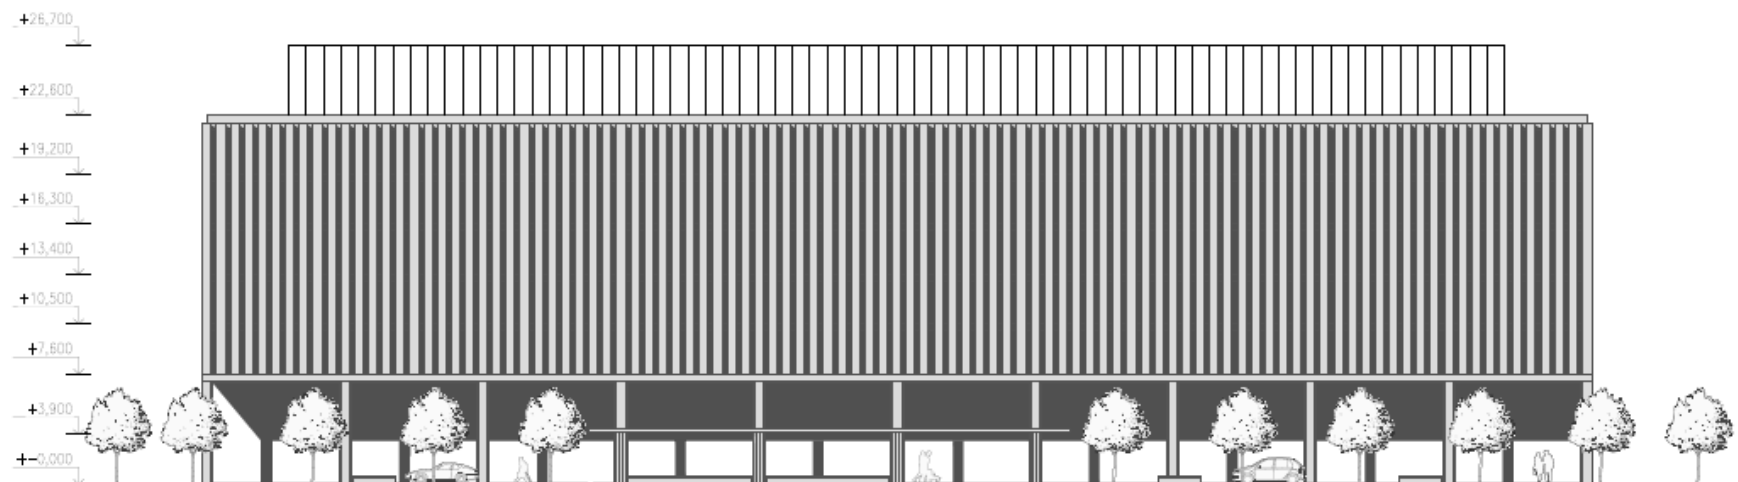

POHLED OD VÝCHODU (od silničního nadjezdu)

